

# Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej od dnia 30 maja 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r

## 1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach

Wartość robót: **20 509 035,86 zł.**

Nadzór inwestorski: **125 600,00 zł.**

Wykonawca: Lider: PNB Budownictwo Sp. z o.o. Biała Podlaska,  
Partner: PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo



Stan realizacji: w trakcie, wykonano roboty wewnętrzne w budynku **100** %, pozostał montaż turbin wiatrowych do 19 lipca 2025 r.

Kubatura - **14 002,45 m3**, powierzchnia użytkowa **2 206,38 m2**.



# 1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach.

W trakcie realizacji jest budowa dwóch turbin wiatrowych (2x 10 kW) do wytwarzania energii elektrycznej z tzw. OZE na potrzeby GCKiS.


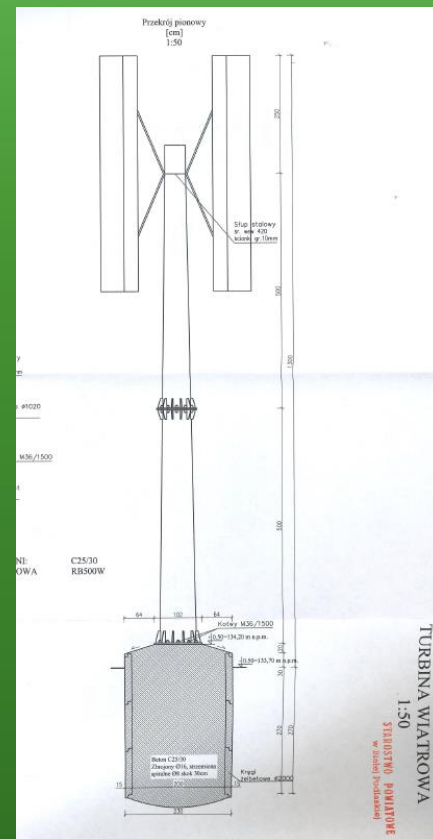
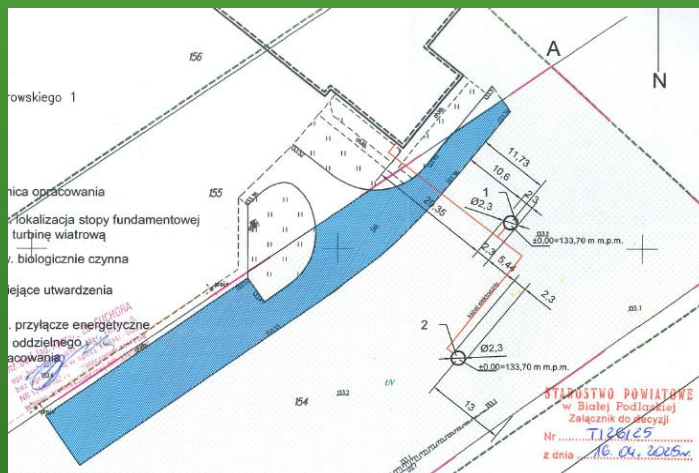


## 2. Dostawa mebli i innego wyposażenia do budynku Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

**Wartość dostawy: 419 689,53 zł.**

**Wykonawca: najtańsza oferta złożona przez Impex Trade Sp. z o.o. Katowice**

**Termin realizacji: dwa miesiące od dnia podpisania umowy, która jest planowana na lipiec 2025 r.**

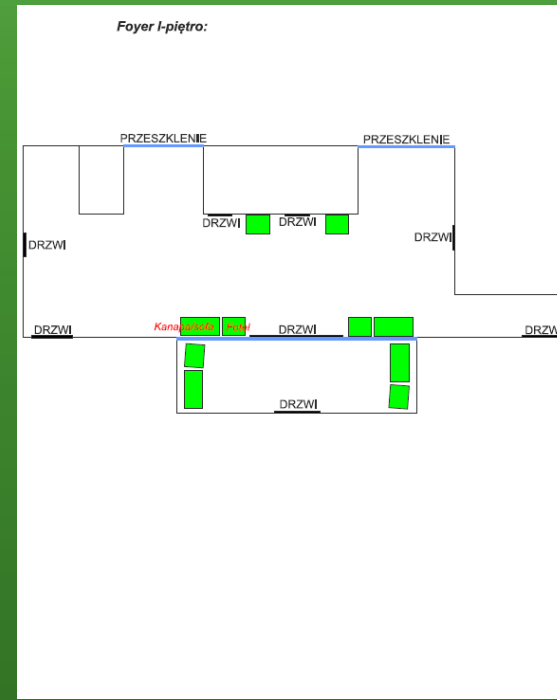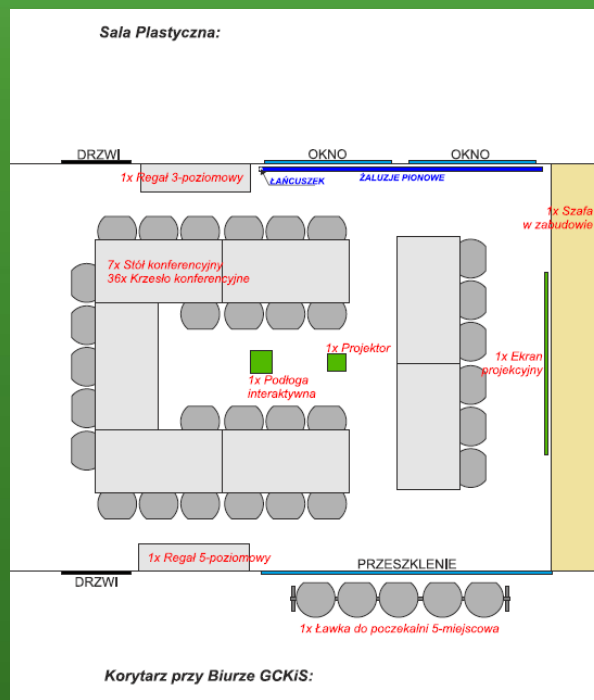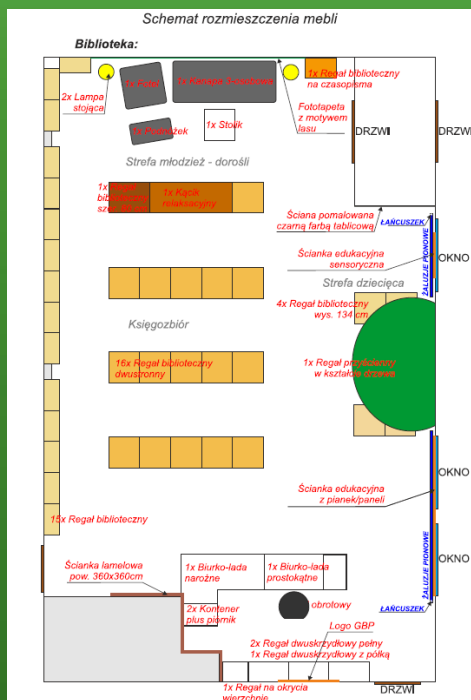

### 3. Przebudowa i budowa dróg Gminy Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Wartość robót: **6 947 185,18 zł.**

Nadzór inwestorski: **125 600,00 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Biała Podlaska

Stan realizacji: zakończono część 1 - wykonano budowę i przebudowę ul. Sportowej w Łobaczewie Małym – **263,5 mb.**

Część 2 -do dnia 19 lipca 2025 r. - przebudowa drogi powiatowej nr 1049 L ( DK nr 2 – Michalków).





## 4. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2024”

Wartość robót: **2 284 259,60 zł.**

Nadzór inwestorski: **74 000,00 zł.**

Wykonawca: Tradbud Sp. z o.o. Biała Podlaska

Stan realizacji: wykonano stan surowy budynku, rozpoczęto układanie instalacji elektrycznej i tynków wewnętrznych.

Termin wykonania: do 30 września 2025 r.

Kubatura - **803,97 m3**, powierzchnia użytkowa **269,79 m2**.

Dofinansowanie do budowy z KPO – **1 698 226,56 zł.**



## 5. Budowa drogi gminnej - ulica Północna w Małaszewiczach Dużych.

Wartość robót: **1 145 911,20 zł.**

Nadzór inwestorski: **23 370,00 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Elbud  
Eliasz Pietraszuk Łobaczew Duży.

Stan realizacji: podpisano umowę, zadanie realizowane z  
dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024.  
Termin wykonania: dziewięć miesięcy.



## 6. Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Wartość robót: **5 699 204,88 zł.**

Nadzór inwestorski: **61 500,00 zł.**

Wykonawca: Tres-Bud Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Treska  
Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie, kwota wnioskowanego  
dofinansowania z funduszu europejskich **4 830 114,43 zł.**

Termin wykonania: dziewięć miesięcy.





## 7. Rozbudowa odcinka drogi gminnej Koroszczyn – Lechuty Małe.

Wartość robót: **1 733 679,05 zł.**

Nadzór inwestorski: **18 000,00 zł.**

Wykonawca: Tre-Drom Sp. z o.o. Biała Podlaska

Stan realizacji: w trakcie realizacji od km 0+003,50 do km 0+325,30 oraz od km 0+338,40 do km 1+233,00.

Termin wykonania: sześć miesięcy od dnia 6 maja 2025 r.





## 8. Budowa altany w Krzyczewie.

Wartość robót: **39 100,00 zł.**

Wykonawca: Ealtany Patryk Gajda, 42-244 Mstów.

Stan realizacji: w trakcie realizacji.

Termin wykonania: trzy miesiące od dnia 6 czerwca 2025 r.

