

Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej od dnia 31 marca 2025 r. do dnia 25 kwietnia 2025 r

1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach

Wartość robót: **20 509 035,86 zł.**

Nadzór inwestorski: **125 600,00 zł.**

Wykonawca: Lider: PNB Budownictwo Sp. z o.o. Biała Podlaska,

Partner: PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo

Stan realizacji: w trakcie, wykonano około **96 %**, termin wykonania do 19 czerwca 2025 r.

Kubatura - **14 002,45 m³**, powierzchnia użytkowa **2 206,38 m²**.




1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach.



1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach.



1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach.

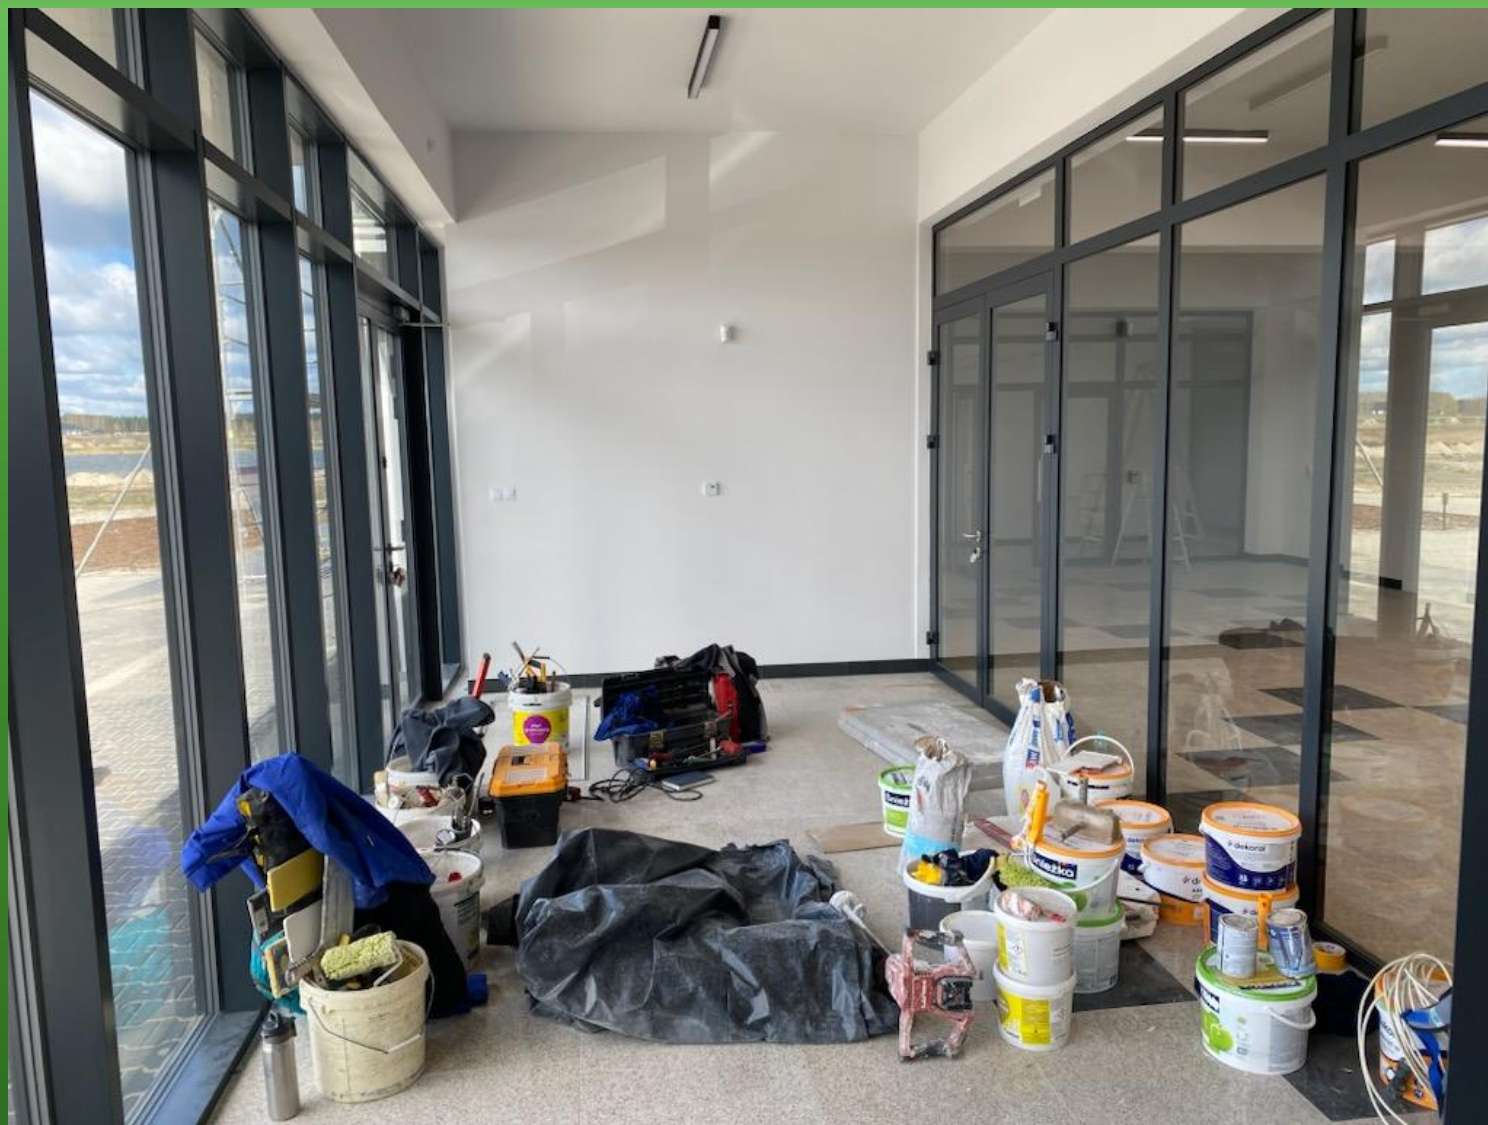

1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach.



1. Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach.



2. Przebudowa i budowa dróg Gminy Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Wartość robót: **7 016 102,42 zł.**

Nadzór inwestorski: **125 600,00 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Biała Podlaska

Stan realizacji: zakończono budowę i przebudowę ul. Sportowej w Łobaczewie Małym.

Realizowane są roboty związane przebudową drogi powiatowej nr 1049 L (DK nr 2 – Michalków).



2. Przebudowa i budowa dróg Gminy Terespol uszkodzonych w wyniku działań operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Droga powiatowej nr 1049 L (Droga Krajowa nr 2 – Michalków).



3. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2024”

Wartość robót: **2 284 259,60 zł.**

Nadzór inwestorski: **74 000,00 zł.**

Wykonawca: Tradbud Sp. z o.o. Biała Podlaska

Stan realizacji: w trakcie, wymurowano ściany parteru, wylano strop nad parterem.

Termin wykonania: do 30 września 2025 r., dotacja z KPO **1 698 226,56 zł.** Kubatura - **803,97 m³**, pow. użytkowa **269,79 m².**



3. Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2024”.



4. Budowa drogi gminnej ulicy Północnej w Małaszewiczach Dużych.

Wartość robót: **1 145 911,20 zł.**

Nadzór inwestorski: **23 370,00 zł.**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Elbud
Eliasz Pietraszuk Łobaczew Duży.

Stan realizacji: rozpoczęta budowa.

Zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg 2024.



5. Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego.

Wartość robót: **5 699 204,88 zł.**

Nadzór inwestorski: **61 500,00 zł.**

Wykonawca: Tres-Bud Usługi Ogólnobudowlane Mateusz Treska
Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie, kwota wnioskowanego
dofinansowania z funduszu europejskich **4 830 114,43 zł.**

Termin wykonania: dziewięć miesięcy.



6. Dokumentacje projektowe w realizacji.

1. Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lebiedziewie:

Wartość projektu: **59 655,00** zł.

Wykonawca: Devis Igor Sobol Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie, okres realizacji 10 miesięcy.

Zadanie: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

2. Dokumentacja projektowa budowy drogi na działce nr ew. 58 w Kobylanach (ul. Jaszczołda)

Wartość projektu: **28 000,00** zł.

Wykonawca: Projekty i Nadzory Drogowe Teresa Harko Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie, okres realizacji 8 miesięcy.

Zadanie: Budowa dróg łączących drogę nr 100 795 L w Kobylanach z drogą 100 825 I w Małaszewiczach Małych.

3. Projekt budowlany przebudowy odcinka drogi nr ew. 100 793 L w Łobaczewie Dużym. Wartość projektu: **29 500,00** zł.

Wykonawca: Devis Igor Sobol Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie, okres realizacji 10 miesięcy.

6. Dokumentacje projektowe w realizacji.

4. Projekt budowlany budowy i przebudowy odcinka wodociągu w Koroszczynie.

Wartość projektu: **17 500,00** zł.

Wykonawca: Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych Paweł Adamczyk Biała Podlaska. Stan realizacji: w trakcie, okres realizacji 3 miesiące.

5. Dokumentacja projektowa budowy drogi gminnej na działce nr 477 w Małaszewiczach Małych

Wartość projektu: **52 000,00** zł.

Wykonawca: Projektowanie i Nadzór Dariusz Borowski Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie, do 24 października 2025 r.

Zadanie: Budowa dróg łączących drogę nr 100795 L w Kobylanach z drogą nr 100 825 L w Małaszewiczach Małych.

6. Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia w Neplach (ul. Polna)

Wartość projektu: **9 840,00** zł.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo – Usługowe Zenon Szołucha, 21-500 Biała Podlaska ul. Łomaska

Stan realizacji: w trakcie, do 24 października 2025 r.

6. Dokumentacje projektowe w realizacji.

7. Dokumentacja projektowa budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Neplach, ul. Parkowa 12 i ul. Parkowa 14.

Wartość projektu **16 900,00 zł.**

Wykonawca: Biuro Usług Projektowo-Wykonawczych Paweł Adamczyk Biała Podlaska.

Stan realizacji: w trakcie do 30 sierpnia 2025 r.

7. Dotacja celowa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 2025 roku.

W 2025 r. kontynuowana jest dotacja na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

Złożono cztery wnioski o udzielenie dotacji:

- na wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 2 szt.,
- na montaż pompy ciepła do grzania wody - 1 szt.,
- na instalację kolektor słonecznego do grzania wody – 1 szt.

Rozliczono już trzy umowy wypłacając łącznie 6 tyś. zł. dotacji.



8. Dotacja celowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w 2025 roku.

W 2025 r. podpisano cztery umowy o dotację:

- na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej - 1 szt.,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym - 3 szt.

Nie rozliczono jeszcze żadnych wniosków.



9. Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

W 2025 r. złożono 21 wniosków, w tym:

- pompy ciepła 5 szt.,
- piece na pellet 8 szt.,
- kotły na gaz 5 szt.,
- kotły zgazowujące drewno 3 szt.

Rozliczono już cztery umowy i wypłacono dotację w łącznej wysokości 20 000,00 zł.



Rok produkcji 2009 – zdemontowany w 2024 r.

Zakaz używania starych pieców od 1 stycznia 2024 r. w woj. Lubelskim.

10. Roboty różne wykonane przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol.

1. Pielęgnacja terenów zielonych należących do gminy Terespol.
2. Dowóz dzieci do szkoły w Zalutyniu.
3. Zakończenie remontu świetlicy w Łęgach.
4. Rozpoczęcie remontu budynku komunalnego w Neplach ul. Parkowa 14.
5. Naprawa maszyn i sprzętu.
6. Uprzątnięcie lokalu mieszkalnego i otoczenia budynku komunalnego w Murawcu 65.
7. Uprzątnięcie terenów gminnych w Małaszewiczach.
8. Wycinka drzew przy Szkole w Małaszewiczach.
9. Nasadzenia drzew i krzewów, nasadzenia zastępcze w Neplach.
10. Koszenie terenów gminnych.
11. Montaż osłony śmietnikowej na stadionie w Kobylanach.
12. Wykonywanie innych prac związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

11.NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Obowiązkowe kontrole wywozu nieczystości 2023-2024 na terenie Gminy Terespol:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - zbiorniki szczelne | - 482 szt. |
| - przydomowe oczyszczalnie ścieków | - 622 szt. |
| - sporządzono protokołów | - 802 szt. |

Obowiązkowe kontrole wywozu nieczystości 2025-2026 na terenie Gminy Terespol:

- kontynuowane będą do 31 grudnia 2026 r. - właściciel posesji lub zarządzający ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty na wezwanie pisemne lub okazać je bez wezwania (pokój nr 2A).

KONIEC

KONIEC
